

# 工 程 管 理

## 1 実施工程表の提出について

(1) 実施工程表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第1回目を、その後は毎月初め（請負金額3,000万円未満は2ヶ月に1回）に提出するものとする。

なお、当初請負額1,000万円未満の工事の実施工程表については、第2回目から省略するものとする。

(2) これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出して良い。

## 2 記入要領

(1) 工種、種別欄には工程管理上の要素が少なく、かつ工程を理解する上で支障のないものは記入しなくて良い。

(2) 所要日数欄には所要の実作業日数を記入する。

(3) 工程の上段には予定数量を、下段には実績数量と出来高パーセントを（ ）書で記入する。

1,000

(4) 予定数量を変えるときは~~2,000~~のように前回の予定を線引きし上に新計画を記入する。

(5) 変更のあったときはその時点で変更数量により予定を組み替え提出する。

### 【工事出来高報告表】

4,000

(1) 予定金額工程を変えるときは~~3,000~~のように前回の予定を線引きし、その上に新計画を記入する。

(2) 実施金額工程は実施工程表提出時点の出来高を記入する。

(3) 変更のあったときはその時点で変更額により予定金額工程表及び実施金額工程の累計パーセントを訂正し提出する。

実施工程表・工事出来高報告表 記入例 1

様式施-1(仕第3-1-1-2条関係)

工務課長		総括副参事		監督員	
------	--	-------	--	-----	--

工事名	河川改修工事	工期	年月日 ~ 年月日	受注者	岡山建設
工事番号	1-6	契約 変更年月日	契約 年月日 変更 年月日	現場代理人	岡山 太郎
(路線・河川名) 工事場所	一級河川○○川 岡山市首部	金額	請負金額 ¥50,000,000 変更請負金額	主任(監理) 技術者	岡山 太郎

実 施 工 程 表

第 3 回 年 月 日  
第 2 回 年 月 日  
当 初 年 月 日

工種	種別	数量	所要 日数	月 別 ( ) は %												摘 要		
				8	9	10	11	12	1	2	3							
準備工		1式	20	1式 (100)														
土工	掘削	6,000m3	60	500 600 (10)	1400 1200 (30)	1700 1400	1500	1000										
	岩掘削	500m3	25	200 150 (30)	120 100 (20)	140	230 200											
擁壁工	擁壁コンクリート	2,000m3	20	1000 800 (40)	500	700 500	500											
	積ブロック	500m2	40	120 100 (20)	200 190	190	200											
排水工	U字側溝 U4-B300	500m	40	50 0	250 200	200	50	200										
	角フリューム 呼称 300	300m	25				180	200										
後片付		1式	20													1式		

工事出来高報告表

(千円)

予 定 金 額 工 程	500	8,000	12,500	8,200	10,200	7,000	4,000	500						
実 施 金 額 工 程	600	7,000	12,000	8,000	10,000									

( ) は累計%

<実施工程表・工事出来高報告書の提出について>

- (1) 実施工程表・工事出来高報告書は工事の進行を確認するため、受注者が工事着手前に当初(様式契-1)を、その後は毎月初め(当初請負金額3,000万円未満は2カ月に1回)に当該様式(様式施-1)で提出するものとする。なお、当初請負額1,000万円未満の工事の実施工程表については、工事着手後の提出は省略するものとする。
- (2) これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。

実施工程表・工事出来高報告表 記入例 2

様式施-1(仕第3-1-1-2条関係)

工務課長		総括副参事		監督員	
------	--	-------	--	-----	--

工事名		工 期	~	受注者	
工事番号		契約 変更年月日	契約 変更	現場代理人	
(路線・河川名) 工事場所		金 額	請負金額 ¥29,820,000 変更請負金額	主任(監理) 技 術 者	

実 施 工 程 表

第 3 回 年 月 日  
第 2 回 年 月 日  
当 初 年 月 日

工 種	種 別	数量	所要 日数	月 別 ( ) は %												摘 要			
				9	10	11	12	1	2	3									
準 備 工		1式	30			1式													
切 土 工	法面整形	964m <sup>2</sup>	20			200	964												
緑 化 工	植生基材吹付工 t=3cm	885m <sup>2</sup>	20				285					600							
ア ン カ ー 工	足場工	561空m <sup>3</sup>	40				200	361											
ア ン カ ー 工	SFL-3 20.7m/本	21本 (401.1m)	20						21										
受 圧 板 工	フィットフレーム FIT25W-480	21基	30							5	16	96.5							
技 術 管 理	調査ボーリング φ66	2箇所	10				2												出来高% 100
	基本試験 φ86	1箇所	10				1					65.3							80
後 片 付		1式																	40
																			20
																			0

工 事 出 来 高 報 告 表

予 定 金 額 工 程	605	932	4,627	11,275	2,063	9,282	1,036													29,820	
実 施 金 額 工 程	605	747	648																		
	( 2)	( 4.5)	(14.0)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

( )は累計%

<実施工程表・工事出来高報告書の提出について>

- 実施工程表・工事出来高報告書は工事の進行を確認するため、受注者が工事着手前に当初(様式契-1)を、その後は毎月初め(当初請負金額3,000万円未満は2カ月に1回)に当該様式(様式施-1)で提出するものとする。なお、当初請負額1,000万円未満の工事の実施工程表については、工事着手後の提出は省略するものとする。
- これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。

実施工程表・工事出来高報告表 記入例 3

様式施-1(仕第3-1-1-2条関係)


工務課長		総括副参事		監督員	
------	--	-------	--	-----	--

工事名		工 期	~	受注者	
工事番号		契約 変更年月日	契約          変更	現場代理人	
(路線・河川名) 工事場所		金 額	請負金額          変更請負金額 ¥54,270,300	主任(監理) 技 術 者	

実 施 工 程 表

第 5 回          年          月          日  
 第 4 回          年          月          日  
 第 3 回          年          月          日  
 第 2 回          年          月          日  
 当          初          年          月          日

工 種	種 別	数量	所要 日数	月 別 ( ) は %												摘 要			
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月				
準備工	伐採・地下埋設調査・電線管理者協議・伐採	一式	40 日	■	■	■													
仮設工	特殊部・矢板・覆工板	4箇所	4 日			■	■	■	■	■									
プレキャストボックス工	掘削・据付・埋戻し・仮復旧	4箇所	8 日			■	■	■	■	■									
分岐柵(1)(2) ハンドホール工	掘削・土留・配管・埋め戻し・仮復旧	10箇所	4 日					■	■	■	■								
管路工	掘削・土留・配管・埋め戻し・仮復旧	146m	85 日					■	■	■	■	■							
照明基礎工	H-300・H-250	6基	10 日							■	■	■	■	■					
付帯工事	路面排水・既設構造物復旧工事	146m	12 日										■	■					
舗装工	歩道舗装工	274m <sup>2</sup>	2 日											■	■				
	排水性舗装工	700m <sup>2</sup>	6 日													■	■	■	■

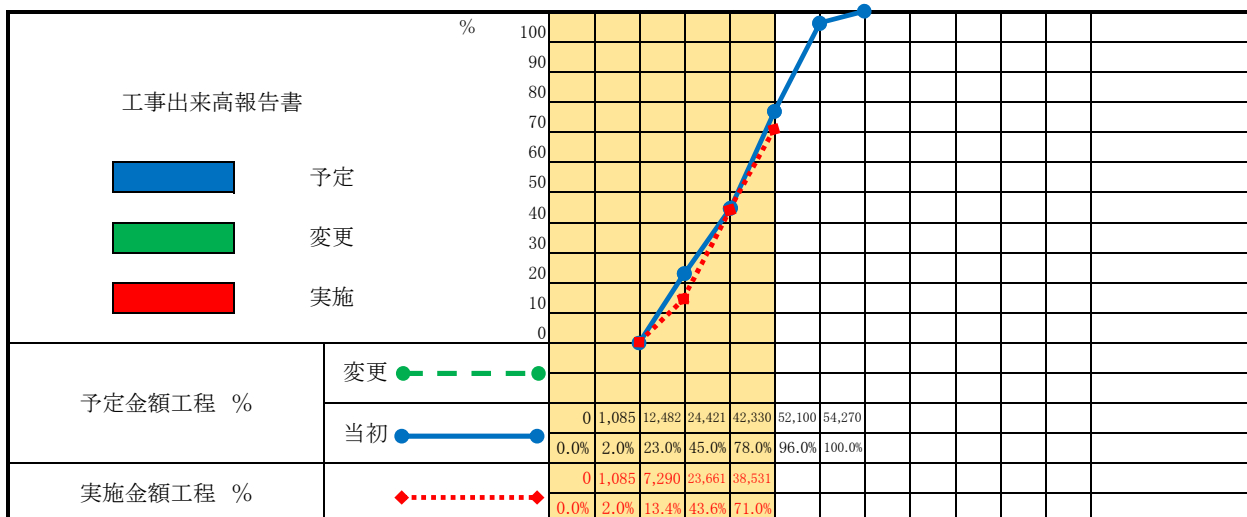

様式施-1(仕第3-1-1-2条関係)

工務課長		総括副参事		監督員	
------	--	-------	--	-----	--

工事名		工期	～	受注者	
工事番号		契約 変更年月日	契約 変更	現場代理人	
(路線・河川名) 工事場所		金額	請負金額 変更請負金額	主任(監理) 技術者	

# 実施工程表

第 回 年 月 日  
第 回 年 月 日  
当 初 年 月 日

工種	種別	数量	所要 日数	月 別 ( ) は %												摘 要		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

## 工事出来高報告表

(千円)

予 定 金 額 工 程																		
実 施 金 額 工 程	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

( )は累計%

- <実施工程表・工事出来高報告表の提出について>  
 (1) 実施工程表・工事出来高報告表は工事の進行を確認するため、受注者が工事着手前に当初(様式契-1)を、その後は毎月初め(当初請負金額3,000万円未満は2カ月に1回)に当該様式(様式施-1)で提出するものとする。なお、当初請負額1,000万円未満の工事の実施工程表については、工事着手後の提出は省略するものとする。  
 (2) これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。
